


CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO


Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e 6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B. Sistema pedemontano lombardo e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco)

Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse

SCHEDA N. 25

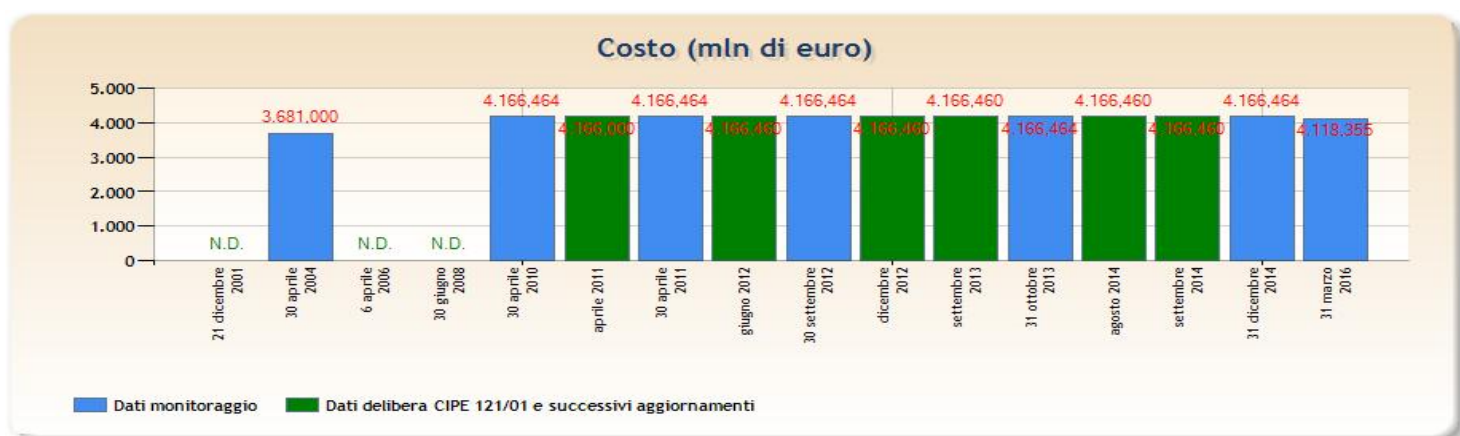

LOCALIZZAZIONE

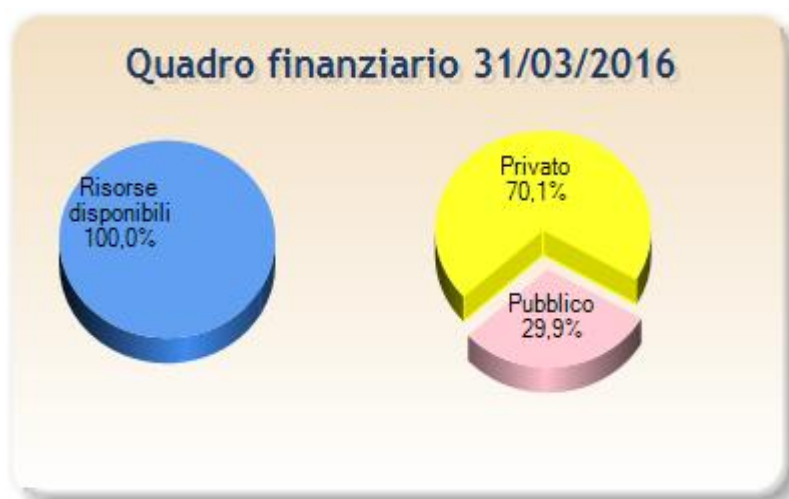

CUP:

F11B06000270007

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

Concessioni Autostradali Lombarde
Spa/Autostrada Pedemontana
Lombarda Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

ULTIMAZIONE LAVORI

2021

CLASSIFICAZIONE INTERVENTO

Classificazione: Opera prioritaria DEF 2015

DESCRIZIONE

L'Autostrada Pedemontana Lombarda è un sistema viabilistico con uno sviluppo complessivo di circa 157 km, di cui 67 km di autostrada, 20 km di tangenziali e 70 km di viabilità locale. Il Sistema Viabilistico Pedemontano si compone delle seguenti infrastrutture viarie:

- Un asse autostradale (67 km) da Cassano Magnago (Va) a Osio Sotto (Bg), che collega le esistenti autostrade A8 Milano-Varese, A9 Milano-Como e A4 Torino-Venezia, suddiviso in 5 tratte:

- tratta A: tra le autostrade A8 e A9 (15 km);

- tratta B1: dall'interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35 (7,5 km);

- tratta B2: da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno (9,5 km);

- tratta C: da Cesano Maderno all'interconnessione con la Tangenziale Est/A51 (16,5 km);

- tratta D: dalla Tangenziale Est/A51 all'autostrada A4 (18,5 km);

- Le tangenziali di Como e di Varese (20 km):

- 1 lotto della tangenziale di Varese: dall'autostrada A8 (Gazzada Schianno) al ponte di Veduggio;

- 2 lotto della tangenziale di Varese: da Follonica di Malnate al valico del Gaggiolo;

- 1 lotto della tangenziale di Como: dall'autostrada A9 (Grandate) allo svincolo di Acquafredda;

- 2 lotto della tangenziale di Como: dallo svincolo di Acquafredda ad Albese con Cassano (SS 342);

- Un sistema di "opere connesse" e "opere di viabilità locale", per un totale di 21 interventi e uno sviluppo complessivo di 70 km, al fine di migliorare la connessione con la rete della viabilità ordinaria, principale e secondaria. Il Sistema viabilistico pedemontano interessa 4 Province (Bergamo, Como, Milano e Varese) e 78 Comuni. Nel complesso lo sviluppo dell'intervento autostradale è previsto per circa km 51,2 in sede naturale (59,1%), km 4,2 in viadotto (4,8%) e km 31,3 in galleria (36,1%); la sede stradale prevede 2 o 3 corsie per senso di marcia. E' prevista la realizzazione di numerose opere connesse per oltre 48 km con sezione tipo C1 ad una corsia per senso di marcia più banchina laterale, che consentono il pieno inserimento dell'asse autostradale nel cosiddetto Sistema viabilistico pedemontano. Tra le principali opere connesse si evidenziano: la variante alla ex SS 233 "Varesina" da Tradate a Origgio (tratta A); la variante alle SP 31 e SP 133 da Bregnano a Ceriano Laghetto (tratta B1); la variante alla SP 6 da Albiate a Biassoni (tratta C); la tangenziale di Arcore (tratta C); il collegamento Bernareggio-Bellusco (tratta D); la Dorsale dell'Isola bergamasca da Terno d'Isola a Filago (tratta D). Il progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 97/2009 non include il secondo lotto della Tangenziale di Varese e il secondo lotto di quella di Como, in quanto non ricompresi nel Piano Economico Finanziario della Convenzione Unica. La realizzazione degli interventi è prevista in due fasi:

Fase 1 - 1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse;

Fase 2 - Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse.

DELIBERE CIPE

94/2005

77/2006

108/2007

97/2009

Seduta del 18/04/2014

24/2014

DATI STORICI

1986

Si costituisce la Società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, partecipata da Autostrade per l'Italia Spa (50%) e Milano Serravalle-Milano Tangenziali (50%) per la costruzione e gestione, in regime di concessione, dell'autostrada Pedemontana lombarda.

1990

Viene stipulata la convenzione tra l'ANAS e l'Autostrada Pedemontana Lombarda, approvata dal MIT.

1999

Viene sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, le Province interessate, i Comuni di Como e di Varese, l'ANAS e la Società Pedemontana.

2001

La società Autostrada Pedemontana Lombarda invia alla G. U. dell'UE il bando per l'affidamento della "progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale. L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121.

2002

La società Autostrada Pedemontana Lombarda aggiudica all'ATI il contratto per la redazione della progettazione preliminare e dello studio di prefattibilità ambientale.

2003

L'intervento è compreso nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Lombardia dell'11 aprile.

L'ANAS approva il progetto preliminare, predisposto dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda, concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio del collegamento autostradale.

2004

L'ANAS trasmette al MIT la prima versione del progetto preliminare.

La Società concessionaria richiede al Ministero dell'ambiente la sospensione della procedura istruttoria per apportare al progetto preliminare le integrazioni e modifiche necessarie richieste dalla Regione Lombardia.

La Regione Lombardia esprime parere favorevole in merito all'approvazione ed alla compatibilità ambientale del progetto, formulando numerose prescrizioni e richiedendo il completamento del percorso autostradale nel tratto Cernusco-Desio, con relativo SIA.

L'ANAS approva il nuovo progetto preliminare "Integrazioni e modifiche: tratta B1 (ex B) e tratta B2 nuova": le tratte B1 e B2 sostituiscono la tratta B precedente e interessano le province di Como e di Milano dalla interconnessione con la A9 a Lomazzo fino a Cesano Maderno/Desio, inizio della tratta C della autostrada Pedemontana, e coinvolgono 17 Comuni e due Parchi e lo trasmette al MIT.

2005

La Regione Lombardia esprime parere favorevole all'approvazione, alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione del progetto preliminare aggiornato, formulando ulteriori prescrizioni.

Il Ministero dell'ambiente trasmette il parere favorevole in merito al progetto preliminare aggiornato, condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni.

Il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole con prescrizioni.

Il CIPE, con delibera n. 94, approva, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare nella versione aggiornata con le integrazioni e modifiche necessarie per completare il percorso autostradale.

Il CIPE ritirerà tale delibera a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti per la mancata presentazione del piano finanziario e delle forme e delle fonti di finanziamento dell'opera.

La legge n. 266/2005 (art. 1, comma 78) autorizza un contributo annuo di 200 Meuro per 15 anni per interventi

infrastrutturali, riservando all'opera e opere del "sistema pedemontano lombardo, tangenziale di Como e di Varese" una percentuale non inferiore al 2% delle "risorse disponibili".

2006

L'ANAS approva l'aggiornamento del piano finanziario predisposto dalla Pedemontana Lombarda, che tiene conto del costo delle prescrizioni proposte dal MIT nella relazione istruttoria.

Il CIPE, con delibera n. 77, prende atto del nuovo piano finanziario ed approva il progetto preliminare.

La legge n. 296/2006 (art. 1, comma 979) autorizza tre contributi quindicennali per complessivi 80 Meuro quale concorso dello Stato al completamento della Pedemontana Lombarda.

2007

Si costituisce la società Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL): 50% da ANAS e 50% da Infrastrutture Lombarde Spa (società controllata al 100% dalla Regione Lombardia) per accelerare la realizzazione delle 3 opere: Pedemontana, direttissima Milano-Brescia (Brebemi) e Tangenziale est esterna di Milano (Tem). Viene firmato l'Accordo di Programma per il Sistema Viabilistico Pedemontano tra: MIT, Regione Lombardia, ANAS, società Autostrada Pedemontana Lombarda; i 7 Comuni interessati.

La Lombardia presenta il progetto di legge per accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche viarie/ferroviarie di preminente interesse nazionale delle quali stato riconosciuto il "concorrente" interesse regionale nell'intesa Regione/Stato dell'aprile 2003 (legge regionale n. 15/2008).

Viene firmata la convenzione tra CAL e Pedemontana Lombarda, società concessionaria.

Il CIPE, con delibera n. 108, valuta favorevolmente lo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde e Autostrada Pedemontana Lombarda.

Il Protocollo d'Intesa per la progettazione integrativa e la realizzazione delle opere connesse alla Pedemontana e alla Brebemi stabilisce che l'importo di 83 Meuro (Legge n. 472/1999) destinato al finanziamento della "Gronda ferroviaria merci Seregno-Bergamo" venga ripartito utilizzando 29 Meuro per la progettazione preliminare e definitiva della citata Gronda e che i residui 54 Meuro utilizzati in anticipo rispetto alla realizzazione dell'intera linea ferroviaria per la compartecipazione di RFI alla copertura dei costi di propria competenza delle opere interferite ed integrate con l'autostrada Pedemontana lombarda

2008

Il 22 ottobre viene emanato il DPCM recante "Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015" successivamente modificato dal DPCM 7 aprile 2009, integrato dal DPCM 1 marzo 2010 e sostituito dal DPCM 6 maggio 2013. Il decreto ha istituito gli organi che provvedono a porre in essere tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell'allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell'allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. L'opera "Pedemontana" è inserita tra le opere connesse all'interno della rete viaria di cui all'allegato 2.

2009

Nel Tavolo Lombardia del 23 febbraio viene approvato l'aggiornamento degli elenchi relativi alle opere essenziali, connesse e necessarie per l'accessibilità EXPO 2015 e l'intervento "Pedemontana" risulta inserito tra le opere connesse, con un costo 4.115 Meuro (riferito all'opera con l'esclusione dei secondi lotti delle Tangenziali di Como e di Varese), interamente finanziato, una previsione di avvio lavori per gennaio 2010 e di ultimazione lavori per settembre 2014.

CAL approva il progetto definitivo il 17 aprile e lo trasmette al MIT.

La CdS, indetta dal MIT, si conclude il 27 luglio.

La Regione Lombardia esprime parere favorevole sul progetto, con prescrizioni e raccomandazioni, tra cui lo stralcio dello svincolo Saronno Sud/Uboldo.

Il Ministero della difesa chiede l'inserimento di una prescrizione.

Il Ministero dell'ambiente trasmette al MIT il parere favorevole della Commissione VIA, con prescrizioni, sul progetto definitivo dell'opera e il Ministero per i beni culturali si pronuncia positivamente, con prescrizioni.

La Commissione permanente per le gallerie trasmette il proprio parere favorevole.

Il soggetto aggiudicatore trasmette al MIT il Programma di risoluzione delle interferenze ed una documentazione integrativa con 115 Meuro di oneri per le richieste/prescrizioni acquisite in sede di CdS.

L'Unità tecnica finanzia di progetto esprime le proprie valutazioni nel mese di novembre.

Il CIPE, con delibera del n. 97, approva il progetto definitivo, dopo aver preso atto che sono state apportate alcune varianti e che la proposta di approvazione non include il secondo lotto della Tangenziale di Varese e il secondo lotto di quella di Como, in quanto non ricompresi nel Piano economico finanziario della convenzione unica. Il costo del progetto definitivo viene aggiornato a 4.220,1 Meuro, ai quali va sottratto il costo delle "opere integrate" a carico di RFI di 53,6 Meuro. Pertanto, il costo del progetto risulta di 4.166,5 Meuro: 1.245 Meuro di contributi pubblici ed il resto a carico del concessionario.

2010

Nell'audizione del Presidente dell'ANAS presso l'VIII Commissione della Camera dei Deputati del 3 febbraio, si rileva che CAL ha chiesto alla Cassa Depositi e prestiti di attivare la garanzia FGOP relativamente al valore di subentro e che l'ultimazione dei lavori è prevista per dicembre 2022.

Il 6 febbraio viene inaugurato, a Cassano Magnago, il primo cantiere della Pedemontana.

Il 22 giugno Autostrada Pedemontana Lombarda Spa pubblica il bando per la "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse", per l'importo di 2,3 Meuro. Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Pedemontana lombarda Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011 Aprile

Il 1 febbraio si insedia la Commissione nominata dal MIT per l'affidamento del completamento dei lavori dell'Autostrada Pedemontana Lombarda. La Commissione dovrà valutare le offerte presentate dai cinque grandi gruppi che si contenderanno l'appalto da 2,3 miliardi di euro per la realizzazione delle tratte B1, B2, C e D, le opere stradali locali connesse, le mitigazioni ambientali e oltre 100 km di Greenway. I cinque gruppi in gara che il 14 gennaio presentano offerta sono: Consorzio Pedelombarda 2 composto da Impregilo Spa (Capogruppo), Consorzio Cooperative Costruzioni – Ccc Società Cooperativa, Astaldi Spa, Impresa Pizzarotti & C. Spa, Itinera Spa; Salini Costruttori Spa (capogruppo), Vianini Lavori Spa, Ghella Spa, Todini Costruzioni Generali Spa; Consorzio Stabile Sis Società Consortile per Azioni composto da consorzio stabile fra le imprese Sacyr Sa, Inc Srl, Sipal Spa; Tecnimont Spa (Capogruppo), Saipem Spa, Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, Rizzani De Eccher Spa; Strabag Ag (Capogruppo), Grandi Lavori Fincosit Spa, Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro Spa, Adanti Spa.

Autostrada Pedemontana Lombarda comunica che ad aprile il cantiere di Cassano Magnago sta lavorando alla costruzione del viadotto che scavalcherà la A8, mentre a est della stessa autostrada si scava per la realizzazione della trincea. Nel cantiere di Turate procede, intanto, la costruzione del campo base e un secondo campo base si sta costruendo a Lozza, per la realizzazione della Tangenziale di Varese.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera " Pedemontana lombarda Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che, per le tratte A-CO1-VA1, la progettazione esecutiva è stata approvata dalla Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 4/02/2010 - 21/9/2010 - 11/11/2010. Con riferimento alle tratte B1-B2-C-D, la gara per l'appalto integrato indetta in data 25/06/2010 è in corso di svolgimento. Il progetto definitivo è in istruttoria CIPE.

2011 Dicembre

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 dicembre 2011, con riferimento al "1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse" si rileva che i lavori, iniziati in data 19/2/2010, hanno raggiunto un avanzamento del 9,88% al 31 ottobre 2011 e la loro ultimazione è prevista per dicembre 2013. Per le "Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto tangenziale di Como, 2° lotto tangenziale di Varese" risulta aggiudicato l'appalto integrato all'ATI Strabag AG, Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, Grandi Lavori Fincosit SpA, Andanti SpA, in data 21/11/2011.

2012 Marzo

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2012, con riferimento al "1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse", si rileva un avanzamento del 13,93% al 31 dicembre 2011.

2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS; documento uno "due diligence".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, con riferimento al "1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse", si rileva un avanzamento del 23,27% a tutto il mese di maggio 2012. Per le "Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto tangenziale di Como, 2° lotto tangenziale di Varese" è previsto l'avvio dei lavori ad ottobre 2012 e la loro ultimazione a febbraio 2015.

2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

2013 Giugno

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

Il 6 maggio viene emanato il DPCM "Nomina del Commissario unico delegato del Governo per EXPO Milano 2015" che sostituisce il DPCM 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L'opera "Pedemontana" è inserita tra le opere connesse all'interno della rete viaria di cui all'allegato 2.

2013 Ottobre

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, risultano in corso i lavori su entrambi i lotti. Per il 1° lotto, tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9, viene segnalato un avanzamento del 78,06%, al 30/10/2013. Per il 2° lotto, i cui lavori risultano iniziati ad ottobre 2012, risulta effettuata la consegna parziale dello svincolo di Lomazzo in data 11/03/2013.

2014 Giugno

Il CIPE, nella seduta del 18 aprile 2014, ha preso atto del parere del NARS, che reca prescrizioni per la redazione dello schema di Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione vigente tra il concedente (Concessioni Autostradali Lombarde

Spa, società mista ANAS - Regione Lombardia) e il concessionario (Autostrada Pedemontana Lombarda Spa) e indica uno specifico iter procedurale per la presentazione di un nuovo Piano Economico Finanziario bancabile. Il comitato ha altresì dato mandato al MIT di richiedere al concedente l'atto aggiuntivo adeguato alle prescrizioni del NARS da sottoporre celermente all'approvazione del CIPE.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-1 Corridoio Mediterraneo; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013. Lo stesso giorno, il CIPE, con delibera n. 24, approva, con prescrizioni, misure di defiscalizzazione per riequilibrare il Piano Economico Finanziario dell'opera. In particolare, si prevede: per il periodo dal 2016 al 2027, l'esenzione fiscale ai fini IRES-IRAP per un valore nominale di circa 376 Meuro; per il periodo dal 2019 al 2027, la compensazione del debito IVA, dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, per un valore nominale di circa 424 Meuro. Nella delibera viene indicato, tra l'altro, anche il costo di investimento dell'opera aggiornato desumibile dal quadro economico, al netto del presunto ribasso d'asta per le opere compensative e gli altri investimenti non ancora affidati, pari a 4.118,355 Meuro (un importo ridotto di circa 48,1 Meuro rispetto al costo di investimento dell'opera risultante dal progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera n. 97/2009, pari a 4.166,464 Meuro). I contributi pubblici in conto investimenti sono confermati in 1.245 Meuro.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2014, risultano in corso i lavori su entrambi i lotti.

2016 Marzo

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2015 (aprile e novembre 2015), Allegato 3 Opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, risultano ultimati, in data 11 maggio 2015, i lavori relativi alle tratte A-CO1-VA1. L'avanzamento complessivo dei lavori è del 40,26% e si riferisce ai SAL delle tratte A-CO1-VA1 e della tratta B1.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	3.681,000 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 30 aprile 2005	3.681,000 Fonte: ANAS Spa
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	4.665,504 Fonte: Delibera CIPE 77/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	4.758,180 Fonte: Delibera CIPE 108/2007
Previsione di costo al 30 aprile 2010	4.166,464 Fonte: Delibera CIPE 97/2009
Costo ad aprile 2011	4.166,000 Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011	4.166,464 Fonte: Delibera CIPE 97/2009
Costo al 30 giugno 2011	4.166,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	4.166,464 Fonte: Delibera CIPE 97/2009
Costo a giugno 2012	4.166,460 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)

Previsione di costo al 30 settembre 2012	4.166,464 Fonte: Delibera CIPE 97/2009
Costo a dicembre 2012	4.166,460 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	4.166,460 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	4.166,464 Fonte: Delibera CIPE 97/2009
Costo ad agosto 2014	4.166,460 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	4.166,460 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	4.166,464 Fonte: Delibera CIPE 97/2009
Previsione di costo al 31 marzo 2016	4.118,355 Fonte: Delibera CIPE 24/2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	4.166,000 Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011	4.166,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012	4.166,460 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012	4.166,460 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013	4.166,460 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014	4.166,460 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014	4.166,460 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Disponibilità al 31 marzo 2016: **4.118,355**

Fondi Legge Obiettivo	1.131,800 Fonte: Delibera CIPE 97/2009 e Delibera CIPE 24/2014
Fondi Pubblici	113,200 Fonte: Delibera CIPE 97/2009 e Delibera CIPE 24/2014
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	2.873,355 Fonte: Delibera CIPE 24/2014

Fabbisogno residuo al 31 marzo 2016: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

La progettazione esecutiva delle tratte A-CO1-VA1 è stata sviluppata dal Concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., tra il 11/01/2010 e il 19/02/2013, mediante affidamento a Contraente Generale, e approvata dalla Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, in data 04/02/2010 - 21/09/2010 - 11/11/2010 - 01/03/2012 - 21/02/2013. La progettazione esecutiva delle tratte B1-B2-C-D è stata avviata dal Concessionario in data 24/02/2012, mediante affidamento in appalto integrato, e approvata da Concessioni Autostradali Lombarde SpA in data 27/11/2012, 01/10/2013, 20/06/2014 e 28/10/2014, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, limitatamente alla Tratta B1. L'importo lavori indicato è la somma tra l'importo lavori dei progetti esecutivi approvati (tratte A-CO1-VA1), pari a € 698.813.320,13, l'importo lavori del progetto esecutivo approvato (tratta B1), pari a € 180.258.604,00, l'importo lavori del progetto definitivo inerente le restanti tratte (B2-C-D), pari a € 1.379.491.858,63, al netto del ribasso d'asta, come risultante dal Quadro Economico approvato dal CIPE unitamente alla revisione del PEF con delibera n. 24/2014, e l'importo lavori del progetto definitivo delle opere di completamento, pari a € 106.109.726,12, al netto del presunto ribasso d'asta, come risultante dal Quadro Economico approvato dal CIPE unitamente alla revisione del PEF con delibera n. 24/2014.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	2.364.673.508,88
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	08558150150
Data inizio:	11/01/2010
Data fine:	15/09/2014

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Concessioni Autostradali Lombarde Spa
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Finanza di progetto (ex art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Procedimento a doppia gara - Fase I

Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 08558150150

Data contratto: 01/08/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	2.612.316.233,00
Importo oneri per la sicurezza:	166.743.589,00
Importo complessivo a base di gara:	2.779.059.822,00
Importo aggiudicazione:	2.256.596.576,00
Somme a disposizione:	1.226.908.512,00
Totale:	3.483.505.088,00
% Ribasso di aggiudicazione:	20,00
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note:

La Convenzione per la progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese Valico del Gaggiolo ed opere connesse non è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica bensì ai sensi e per gli effetti della legislazione derogatoria in materia di concessione autostradali (L. n.463/1955; L. n. 729/1961; L. n. 287/1971).

In data 14/11/1986 è stata costituita la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. il cui oggetto sociale è quello di provvedere alla costruzione e alla gestione, in regime di concessione, dell'autostrada Pedemontana Lombarda. In data 29/05/1990 è stata stipulata la Convenzione tra l'ANAS S.p.A. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. Tale Convenzione è stata approvata ai sensi dell'art. 7 della Legge 287/1971 con Decreto Interministeriale 31/08/1990 n. 1524 (registrato dalla Corte dei Conti il 28/12/1990 Reg. 26 Fog. 279). CAL, subentrata ad ANAS ai sensi dell'art.1, comma 979 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha sottoscritto con la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. la Convenzione Unica di Concessione in data 01/08/2007, ai sensi dell'art. 2, comma 82 del D.L. n. 262/2006 convertito in Legge n. 286/2006.

La Convenzione Unica è stata approvata con D. I. del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 18 aprile 2008 e trasmesso al Concessionario in data 24 aprile 2008. L'Atto Aggiuntivo n.1, per l'adozione del PEF allegato al progetto definitivo approvato dal CIPE, è stato approvato con D.I. del 24 marzo 2011. In data 1° agosto 2014 il CIPE ha approvato la revisione del PEF, con assegnazione delle Misure di Defiscalizzazione, di cui all'art. 18 della Legge 183/2011. In data 11 maggio 2015 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica, per l'adozione del nuovo PEF. I dati indicati nel Quadro Economico si riferiscono al QE di cui alla Convenzione del 01/08/2007. I dati indicati nel quadro finanziario si riferiscono al QE di cui all'Atto Aggiuntivo n.2

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	30/06/2021
Stato avanzamento importo:	1.109.461.934,43
Stato avanzamento percentuale:	40,26
Data effettiva inizio lavori:	06/02/2010
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/06/2021
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	10/10/2015

Note:

L'importo e la percentuale di avanzamento lavori si riferisce ai SAL delle tratte A-CO1-VA1 a tutto il mese di Dicembre 2015 e ai SAL della tratta B1 a tutto il mese di Dicembre 2015.
In data 10/10/2015 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle tratte A-CO1-VA1.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

In data 07/03/2016 si è insediata la Commissione per l'Accordo Bonario tra il Concessionario e l'Appaltatore delle tratte B1-B2-C-D, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	120
Giorni proroga totali:	0
Motivi:	
Altri motivi:	Le varianti riportate sono quelle in corso d'opera, presentate successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e sono state adottate, per le tratte A-CO1-VA1, ai sensi dell'art. 176, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., oppure, per la tratta B1, ai sensi dell'art. 132, comma 1 e comma 3 secondo periodo. Tutte le varianti, pur modificando il progetto esecutivo, non costituiscono variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006, in quanto risultano essere state sviluppate in maniera conforme al progetto definitivo dell'Opera, approvato dal CIPE con delibera n. 97/2009.
Importo:	43.133.382,68
Importo oneri sicurezza:	1.841.956,93
Somme a disposizione:	-22.161.031,34
Totale:	22.814.308,27
Note:	

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Convenzione ANAS-Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 29 Maggio 1990

Decreto Interministeriale del 31 Agosto 1990

Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia, le Province interessate, i Comuni di Como e di Varese, l'ANAS e l'Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 26 Gennaio 1999

Bando di gara di progettazione Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del Dicembre 2001

Avviso di aggiudicazione di progettazione Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del Maggio 2002

Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia del 11 Aprile 2003

Delibera Regione Lombardia n. 7/17643 del 21 Maggio 2004

Delibera Regione Lombardia n. VII/20902 del 16 Febbraio 2005

Delibera CIPE4/2005 del 18 Marzo 2005

Delibera CIPE 72/2005 del 27 Maggio 2005

Delibera CIPE 94/2005 del 29 Luglio 2005

Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005

Delibera CIPE 75/2006 del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 77/2006 del 29 Marzo 2006

Legge n. 296 (art. 1, comma 979) del 27 Dicembre 2006

Accordo di Programma Regione Lombardia del Febbraio 2007

Delibera di Giunta della Regione Lombardia del 5 Aprile 2007

Convenzione CAL Spa del 20 Aprile 2007

Bando di gara di lavori Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 19 Luglio 2007

Delibera CIPE 108/2007 del 4 Ottobre 2007

Protocollo d'Intesa per la progettazione integrativa e la realizzazione delle opere connesse alla Pedemontana e alla Brebemi del 5 Novembre 2007

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1667 del 12 Febbraio 2008

Legge regionale n. 15 del 26 Maggio 2008

Avviso di aggiudicazione lavori Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 1 Agosto 2008

DPCM del 22 Ottobre 2008

Tavolo Lombardia del 23 Febbraio 2009
DPCM del 7 Aprile 2009
Atto Concessioni Autostradali Lombarde Spa del 17 Aprile 2009
Delibera Regione Lombardia n. VIII/09542 del 27 Maggio 2009
Delibera CIPE 97/2009 del 6 Novembre 2009
DPCM del 1 Marzo 2010
Bando di gara di lavori Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 22 Giugno 2010
Aggiudicazione Bando di gara Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 21 Novembre 2011
DPCM del 6 Maggio 2013
Seduta CIPE del 18 Aprile 2014
Delibera CIPE 24/2014
del 1 Agosto 2014

SITI INTERNET UFFICIALI

<http://www.regione.lombardia.it>
<http://www.pedemontana.com>
<http://www.stradeanas.it>

1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	691.299.506,85
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	5.771.431,44
Importo di aggiudicazione:	5.771.431,44
Nome aggiudicatario:	Pedelombarda S.c.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	06294710964
Data inizio:	19/02/2010
Data fine:	06/08/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Autostrada Pedemontana Lombarda Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Contraente generale
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase progettuale a base di gara:	Preliminare
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	235 giorni
Lavori:	1650 giorni
Data bando:	17/07/2007
CIG/CUI:	0058244078
Data aggiudicazione:	13/06/2008
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Pedelombarda S.c.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	06294710964
Data contratto:	26/08/2008

Quadro economico:

Importo a base gara:	730.668.250,95
Importo oneri per la sicurezza:	50.573.560,69
Importo complessivo a base di gara:	781.241.811,64
Importo aggiudicazione:	629.664.723,77
Somme a disposizione:	206.486.798,64
Totale:	836.151.522,41
% Ribasso di aggiudicazione:	20,75
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	31/12/2013
Stato avanzamento importo:	927.069.377,13
Stato avanzamento percentuale:	99,85
Data effettiva inizio lavori:	19/02/2010
Data effettiva fine lavori:	11/05/2015
Data presunta fine lavori varianti:	11/05/2015
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	10/10/2015
Note:	Lo Stato di Avanzamento è riferito al Conto Finale oltre Lavori a finire riferiti all'Atto di Sottomissione del 11.05.2015

Contenzioso:

Totale riserve definite:	0
Importo totale riserve definite:	0,00
Totale riserve da definire:	10
Note:	Inscritte n. 68 riserve di cui rinunciate dall'appaltatore n. 58

Sospensione lavori:

Numero totale:	3
Totale giorni sospensione:	214
Note:	

Varianti:

Numero totale:	120
-----------------------	-----

Giorni proroga totali:	495
Motivi:	
Altri motivi:	art. 176, comma 5, lett. a) D.Lgs. 163/2006
Importo:	875.270.354,72
Importo oneri sicurezza:	53.186.510,28
Somme a disposizione:	213.938.724,47
Totale:	1.142.395.589,47
Note:	

Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto tangenziale di Como, 2° lotto tangenziale di Varese

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Il progetto definitivo approvato dal CIPE comprende le sole tratte B1, B2, C, D. Il 2° lotto della tangenziale di Como e il 2° lotto della tangenziale di Varese sono tuttora in istruttoria da parte del CIPE.

Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	1.794.011.973,67
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	35.150.000,00
Importo di aggiudicazione:	19.684.000,00
Nome aggiudicatario:	Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde
Codice fiscale aggiudicatario:	037882390235
Data inizio:	19/06/2008
Data fine:	29/12/2008

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Autostrada Pedemontana Lombarda Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	180 giorni
Lavori:	1140 giorni
Data bando:	22/06/2010
CIG/CUI:	05015579EB
Data aggiudicazione:	21/11/2011
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Strabag AG, Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Andanti S.p.A.

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:	2.171.549.590,44
Importo oneri per la sicurezza:	128.450.409,56
Importo complessivo a base di gara:	2.300.000.000,00
Importo aggiudicazione:	1.713.547.749,35
Somme a disposizione:	935.196.037,60
Totale:	2.648.743.786,95
% Ribasso di aggiudicazione:	27,00
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	21/10/2012
Data presunta fine lavori:	27/02/2015
Stato avanzamento importo:	170.583.263,16
Stato avanzamento percentuale:	9,95
Data effettiva inizio lavori:	21/10/2012
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/06/2021
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	Consegna parziale della Tratta B1 e stralcio Tratta B2 (variante EXPO 2015) in data 04.12.2013. SAL n. 32 al 31.12.2015 Consegna Opere ai sensi art. 230 D.P.R. 207/2010 - Svincolo di Lomazzo in data 26.01.2015 Consegna Opere ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/2010 Tratta B1 in data 06.11.2015

Contenzioso:

Totale riserve definite:	0
Importo totale riserve definite:	0,00
Totale riserve da definire:	130
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	63
Totale giorni sospensione:	63
Note:	N. 63 giorni trattasi di sospensioni parziali dei lavori concessa a partire dal 25.07.2013 sino al 26.09.2013 relativamente allo Svincolo di Lomazzo. Sospensione parziale Lavori Tratta B1 dal 16.10.2015 ancora in corso per rinvenimento rifiuti su sponde e alveo torrente Lura. Sospensione parziale Tratta B1 - vasca di laminazione torrente Lura - per nuova progettazione a seguito di C.d.S. da parte della Regione Lombardia del 18.12.2015 sono stati concessi all'appaltatore n° 36 giorni di proroga sulle attività ricadenti nei lavori dello Svincolo di Lomazzo

Varianti:

Numero totale:	15
Giorni proroga totali:	
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. e) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	6.785.115,05
Importo oneri sicurezza:	177.550,68
Somme a disposizione:	
Totale:	6.962.665,73
Note:	In corso la definizione di apposito atto modificativo al contratto
